

Compte rendu de chantier 6 au 10 juillet 2020

Rédaction Romain Bocquet

Lundi 6 juillet

Journée ensoleillée

8h00-12h00

Rendez-vous 8h00 avec l'équipe des jardiniers pour introduire la session de stages, répartir les équipes et donner quelques précautions sanitaires vis vis de l'épidémie.

Chloé Lebret, Constance Vidon, Oscar Theller et Olivier Gonin entreprennent la tonte des banquettes qui cernent les jardins du pavillon du Duhamel (Cornouiller mâle, Aubépine, Phyllaire, Troène, Orme, Grenadier). L'Orme très vigoureux et le Grenadier subissent plutôt une taille.

Pendant ce temps, Romain est sur la route avec les perches de Robinier nécessaires à la réalisation des portails.

13h00-16h00

L'équipe termine la tonte de la haie pendant que Romain puis Constance et Chloé déplacent la clôture mobile afin de changer le troupeau de parc (passage vers la moitié Ouest, côté des parcelles des étudiants). Olivier et Oscar broient, à l'aide du petit broyeur, les rémanents de la tonte de la banquette et font des apports de compost pour constituer un tas. Peu avant la fin du chantier (16h00), nous faisons migrer le troupeau d'un parc à l'autre. Les brebis semblent contentes de trouver une herbe plus fraîche et se régaler du Cardon et de la Consoude. Il était temps de les changer de parc mais nous n'avons pu le faire plus tôt.

Romain entame la fauche des refus du parc initial à l'aide de la barre de coupe jusqu'à 19h00.

Mardi 7 juillet

Journée ensoleillée

2 informations vont perturber le déroulé du chantier de la semaine:

- Olivier devra être à la documentation 2 jours de la semaine (Mercredi et Jeudi)
- la taille en vert des fruitiers pourtant prévue la semaine précédente n'a pas commencé. Nous ne pouvons ainsi pas profiter des rémanents issus de cette taille pour alimenter, une fois broyés, les paillages aux emplacements des futurs arbres fruitiers.

7h00-9h00

Romain poursuit la fauche rendue difficile du fait que les bêtes mises trop tard dans le parc (à cause du confinement) ont piétiné une herbe haute et les refus.




9h00-12h00

Constance et Chloé commencent à andainer le foin au Nord de la moitié Ouest, pendant que Romain termine la fauche.

13h00-17h00

Chloé et Romain procèdent au piquetage de la trame du pré-verger pendant que Oscar et Constance andainent le foin. Les futurs arbres fruitiers seront matérialisés en attendant la plantation par des tuteurs de bambou 3,60 cm d= 26-28 mm

Trame pré-verger: cf plan ci-après
Un avant trou à la barre à mine est fait au préalable pour enfoncer les tuteurs.

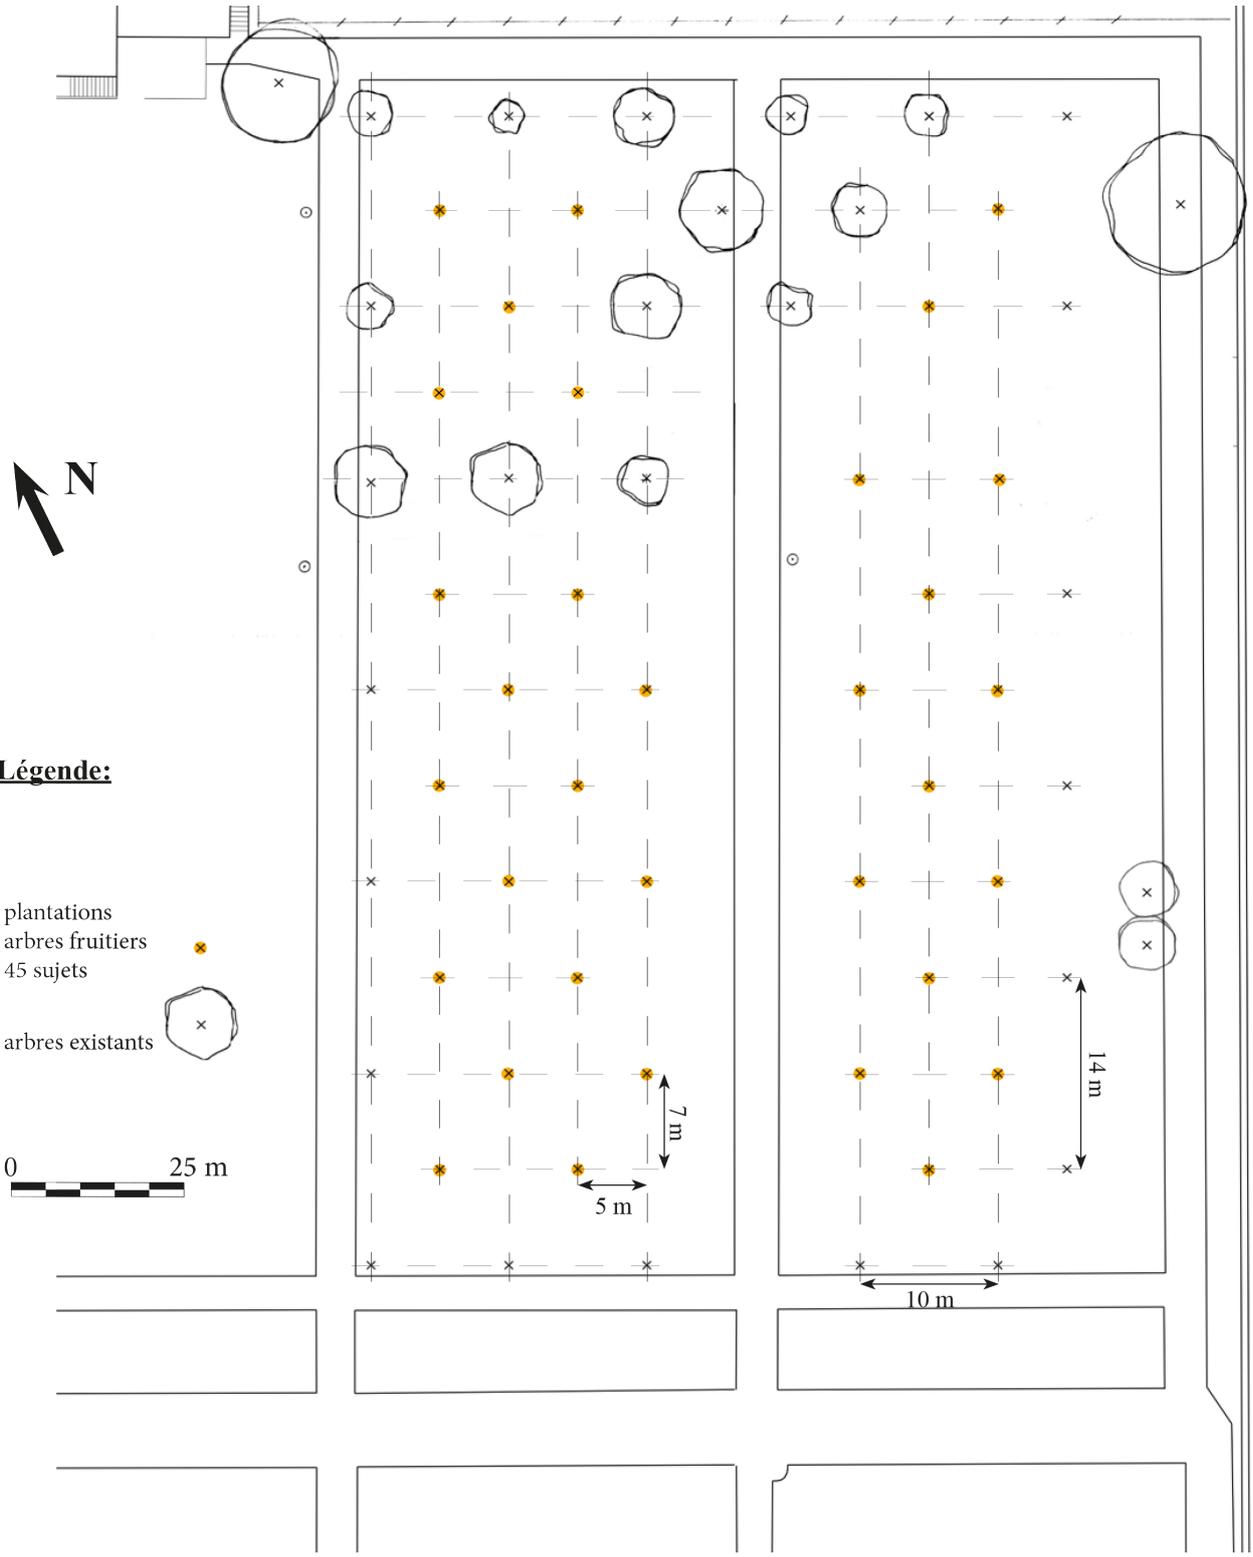

Légende:

- plantations arbres fruitiers 45 sujets
- arbres existants



TRAME DU PRÉ-VERGER

Mercredi 8 juillet

Journée ensoleillée

8h00-12h00

Chloé et Constance terminent l'implantation des tuteurs de bambou sur la moitié Est. Oscar tond le plus ras possible, à la tondeuse puis au rotofil, le couvert herbacé aux pieds des bambous.

Jeudi 9 juillet

Journée ensoleillée

Romain commence à faire un essai de paillage au pied d'un futur arbre. Un cadre de 1,80m x 1,80 m fait de liteaux est fabriqué pour déterminer la limite du paillage au pied de chaque futur-arbre. Le bambou sera placé au centre. Le paillage sera un mille-feuille de différentes couches répandues dans ce cadre:

1- deux brouettes de compost

2- une épaisse couche de foin; ça tombe bien, nous en avons à volonté!

3- une couche de broyat

4- une nouvelle couche de foin

5- arrosage nécessaire étant donné le manque d'eau dans le sol

6- bâche tissée (semaine du 20 au 24 juillet)



1-COMPOST RÉGALÉ DANS LE CADRE



2-COUCHE DE FOIN



3-BROYAT




4-COUCHE DE FOIN



5- ARROSAGE



6- MISE SOUS BÂCHE

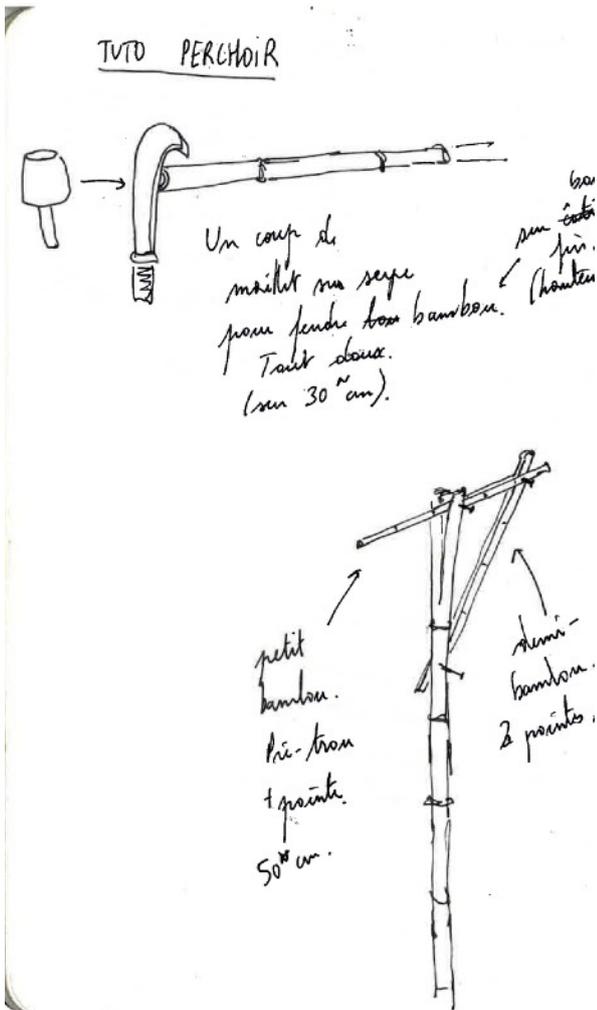

EXTRAIT DU CARNET DE CHLOÉ LEBRET

Ce paillage servant de démonstration, les stagiaires pourront répéter ces différentes étapes aux emplacements des futurs arbres.

Chloé et Constance, en visant bien, mais aussi à l'aide de cordeau et de Pythagore procèdent au piquetage de la moitié Ouest du Pré-verger.

En cours de chantier, nous développons l'idée de faire évoluer quelques tuteurs de bambou en des perchoirs pour les Faucons crécerelle qui nichent en hauteur dans la Cathédrale Saint Louis. Nous ne savons pas si ces perchoirs leur conviendront mais nous tentons l'essai.

Les stagiaires prennent plaisir à faire ces perchoirs et ils alternent à tour de rôle avec d'autres ateliers du chantier.

Vendredi 10 juillet

Journée ensoleillée

Nouvelle fauche de la moitié Est.

Chloé et Constance poursuivent le piquetage de la moitié Ouest. Des ajustements sont à faire; un vrai casse-tête. Heureusement que Pythagore est là pour aider!

Romain fauche à ras au pied des bambous à la débroussailleuse et les stagiaires peuvent alors déposer le compost

Oscar rabat les rosiers et les rémanents sont broyés par Olivier. Nous manquons de rémanents issus de la taille en vert des fruitiers alors pour palier à ce manque, et en attendant, nous trouvons d'autres ressources localement.

Nous prenons un temps, à l'ombre, pour expliquer davantage le projet du Duhamel suite aux questions des stagiaires.

Compte rendu de chantier du 15 au 17 juillet 2020

Mercredi 15 juillet

Ciel nuageux, beaucoup plus agréable pour travailler.

9h00-12h00

Les quantités de compost déposées la semaine précédente aux pieds de chaque bambou étant insuffisantes, une brouette est ajoutée à chacun de la moitié Ouest. Cette couche de compost est recouverte d'une épaisse couche de foin.

13h00-17h00

Chacun se met à andainer pendant une heure la seconde fauche faite par Romain la semaine précédente, puis l'ensemble est mis en différentes meules réparties sur l'ensemble de la moitié Est.

Olivier fait la démonstration de la taille en vert et les stagiaires peuvent alors la pratiquer sur les palmettes horizontales à 4 étages de Reinette grise du Canada. Nous profitons des ressources locales pour alimenter le boyau qui nous manque dans la progression du chantier.



BROYAGE DES RÉMANENTS DE POMMIER

Jeudi 16 juillet

9h30-12h00

Un temps de taille en vert pour faire du broyat ainsi qu'un ramassage des foins.

13h00-17h00

Les volumes de broyat sont encore insuffisants l'équipe se joint alors à celle des fruitiers au 4e des Onze sur pommiers conduits en « Cordon treillis Beccaletto »

Les rémanents sont broyés dans la foulée.

Vendredi 17 juillet

9h30-12h00

Taille en vert des cordons simples de pommier le long de l'allée à l'Est du Fruticetum. L'ensemble des rémanents est broyé et répandu aussitôt comme paillage.

13h00 - 17h00

Idem. L'équipe rejoint celle des fruitiers pour de la taille en vert. Les rémanents sont broyés et répandus aussitôt.

Compte rendu de chantier du 20 au 24 Juillet

Lundi 20 juillet

Journée ensoleillée

9h00-12h00

Les brebis ont merveilleusement débroussaillé le pied du mur du Duhamel ainsi que certains secteurs couverts majoritairement de consoude ou de pétasite mais nous constatons aussi qu'elles se sont régalingées du broyat enfoui sous une couche de foin. Nous prenons alors la décision de progresser dans le parc, « arbre par arbre » ou plutôt « tuteur par tuteur » selon les possibilités d'approvisionnement en broyat. Le paillage au complet, le broyat pris en sandwich entre deux couches de foin est, sans tarder recouvert de la toile tissée pour éviter que les brebis en profitent.


La journée est organisée suivant différents ateliers. Chloé et Constance poursuivent la réalisation de perchoirs pour la moitié Ouest et ajustent l'ancrage de certains tuteurs de bambou. Oscar s'occupe, après avoir été chercher du matériel à la vôte à outils de retirer de la Renouée dans la Noiseraie. Pendant ce temps Romain regroupe le matériel nécessaire à la découpe à chaud de la bâche tissée ainsi que pour l'arrosage des paillages avant recouvrement par cette toile. Oscar broie un petit tas de rémanents de taille-en vert pendant que Chloé et Constance poursuivent le retrait de la Renouée dans la Noiseraie. Romain, découpe quelques morceaux de bâche et fait quelques essais de pose. Les morceaux feront 1,38m (largeur du rouleau) par 2,20m. Quatre agrafes (50x10x50 cm) marqueront les angles et seront reliées par une ficelle en croix.

13h00-17h00

Constance et Chloé découpent les morceaux de bâche. Romain et Oscar vont chercher des rémanents à broyer aux 3e et 4e des Onze pour que nous ne soyons pas bloqués dans la progression de notre chantier. Oscar enchaîne sur le broyage et Romain commence l'installation des morceaux de bâche. Pour varier les occupations, Constance et Chloé terminent l'après-midi en retirant de nouveau de la Renouée dans la Noiseraie. Ce travail un peu pénible est fait à « petite dose » afin de varier les occupations et avec pour objectif que l'ensemble de la Noiseraie ait été passée en revue à l'issue de la semaine de chantier.

Mardi 21 juillet

Les stagiaires commencent la mise en place des morceaux de bâche tissée prédécoupés. Après réflexion et expérimentation, nous utilisons des agrafes longues aux quatre coins du carré paillé et des plus fines et plus courtes à la jonction des deux morceaux de bâche. L'ensemble est ficelé en prenant accroches aux agrafes et en serrant du mieux que nous pouvons.

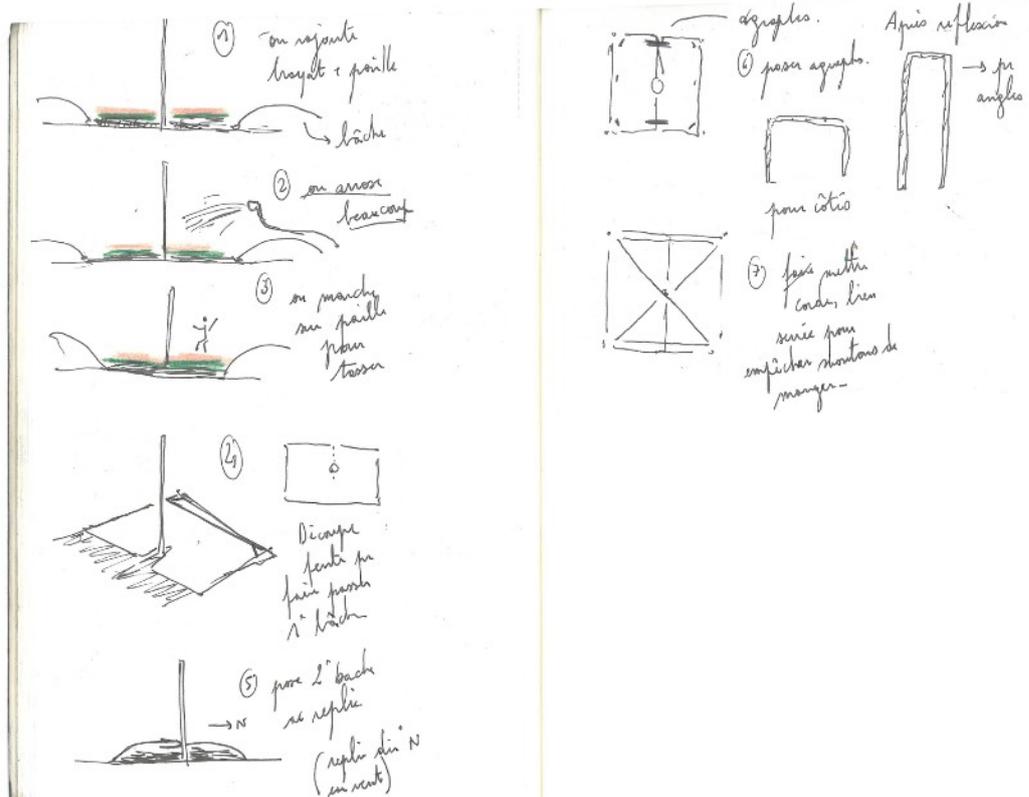

EXTRAIT DU CARNET DE CHLOÉ LEBRET

Mercredi 22 juillet

Aujourd'hui nous fonctionnons à un effectif plus réduit puisque Chloé doit accompagner 2 visites du Potager: 2h le matin et 2 heures l'après-midi.

Constance, Oscar et Olivier partent au Jardin Lelieur afin d'alimenter le chantier en taille en vert pendant que Romain broie les rémanents déposés par les jardiniers en fin de journée de la veille et progressivement ceux produits par l'équipe au Lelieur.



L'AXE DU GRAND PORTAIL MORTAISÉ

La pose des bâches se poursuit (Oscar)

Constance et Chloé se relaient pour écorcer les perches de robiniers pour les portails à la plane.

Marc arrive en fin d'après-midi avec l'axe du grand portail désormais mortaisé. Les traverses déjà tenonnées sont ajustées avec ce montant. L'ensemble des pièces façonnées est assemblé. De la belle ouvrage, la photo parle d'elle-même! Marc peut alors dresser les tenons du côté opposé et tracer les mortaises correspondantes à percer une fois l'ensemble rapporté chez lui. Un grand merci à lui pour son aide précieuse!

Jeudi 23 juillet

9h00-12h00

La mise en place des bâches se poursuit en parallèle de la taille en vert au Lelieur. Nous nous rendons compte que les moutons cherchent à fouiller sous la bâche pour manger le paillage; sans doute sont elles attirées par le broyat et l'eau. Par conséquent, les liens des bâches se détendent. Il faudra les surveiller les couvertures et remettre de la tension.

13h00-17h00

Taille en vert des Palmettes Legendre puis

bâchage; Constance poursuit d'écorcer; Romain découpe et pose des morceaux de bâche; Olivier broie les rémanents. Il faut se presser pour terminer à temps cette semaine. En fin de journée la partie Ouest est terminée.

Vendredi 24 Juillet

L'équipe termine de poser les bâches. Nous choisissons de remplacer les agrafes courtes par des plus longues et de rajouter des ficelles afin de mieux résister aux moutons.

La journée se termine par le déplacement de la clôture mobile. L'ensemble de l'enclos limité par la clôture fixe est mis à pâturer et la noiseraie est mise en défens.

Le reste de compost est épandu aux pieds de certains arbustes du Fruticetum et les outils sont rangés.
Le chantier de paillage s'est terminé juste à temps avant la fin du stage et le début des vacances bien méritées.



Plus tard, en septembre, Marc aura bien avancé les assemblages du grand portail en compagnie de son ami Gabriel Chauvel. Merci à tous les deux. Il reste désormais à ajouter l'écharpe et à poser enfin ce portail sur son pivot forgé.

